



# Aufheizprotokoll -7 Tage-

Produkt: MC-Powerscreed perform  
Bauvorhaben

Objekt: .....

Straße: .....

.....

PLZ/Ort: .....

<b>Bauabschnitt / Stockwerk / Wohnung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		<b>Estrichleger</b>
<b>Estricheinbau (Zeitraum)</b>	<b>Estrichdicke</b>	<b>Fußbodenheizungstyp</b>

Aufheizprotokoll für das Funktionsheizen von beschleunigten Estrichen mit MC-Powerscreed Beschleunigern für eine Belegreife von 7 Tagen.

Gemäß Schnittstellenkoordination ([www.flaechenheizung.de](http://www.flaechenheizung.de)) muss das Funktionsheizen zur Überprüfung der Funktion der beheizten Fußbodenkonstruktion durchgeführt werden. Bei Heizestrichen, die mit MC-Powerscreed Beschleunigern vergütet wurden, darf damit frühestens 3 Tage nach dem Estricheinbau begonnen werden.

**Zu beachten:**

- Nachtabsenkung ausschalten
- Innerhalb eines Estrichfeldes müssen alle Heizkreise gleichzeitig beheizt werden
- Während der Heizphase dürfen keine Putz- und Malerarbeiten ausgeführt werden
- Während der Heizphase dürfen keine Estrichflächen abgedeckt oder zugestellt sein
- Während der Heizphase ist mindestens viermal täglich für 20-30 Minuten stoß zu lüften (keine Zugluft!)
- Nach der Heizphase ist der Estrich bei Abschaltung der Fußbodenheizung bis zur vollkommenen Erkaltung vor Zugluft und zu schneller Abkühlung zu schützen
- Zur Ermittlung der Belegreife ist eine CM-Messung durchzuführen
- Vor CM-Messung & Belagsverlegung ist die Estrichtemperatur auf ca. 20 °C bzw. auf die vom Bodenbelagshersteller vorgegebene Temperatur abzusenken

## Aufheizprogramm


Tag(e) nach Estricheinbau	Soll-Vorlauftemperatur	Ist-Vorlauftemperatur	Datum / Uhrzeit	Unterschrift
1	20 °C			
2	25 °C			
3	25 °C			
4	45 °C			
5	45 °C			
6	45 °C			
7	45 °C			
8	Heizung abschalten, CM-Messung bei ≤ 20 °C			

# Aufheizprotokoll -7 Tage-

Produkt: MC-Powerscreed perform



## 7-Tage-Aufheizprogramm

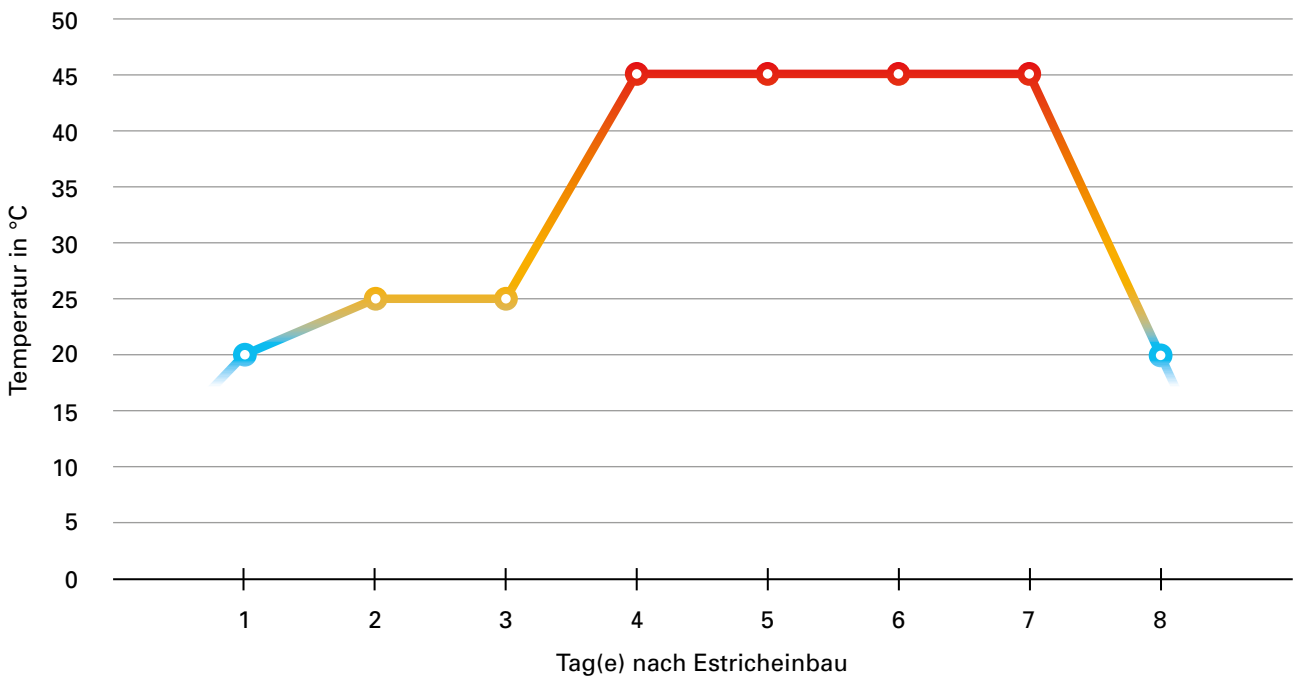

Beginn des Aufheizprotokolls:

Ende des Aufheizprotokolls:

War die Estrichfläche während der gesamten Dauer des Aufheizprotokolls frei von Materialien und Abdeckungen?

Ja

Nein

Wurden während der gesamten Dauer des Aufheizprotokolls Putz- und Malerarbeiten oder andere feuchtigkeitseintragende Gewerke ausgeführt?

Ja

Nein

Wurde während der gesamten Dauer des Aufheizprotokolls regelmäßig stoßgelüftet?

Ja

Nein

## Bestätigung

Ort, Datum

Unterschrift Heizungsbauer

Unterschrift  
Bauleiter / Architekt / Bauherr
